



Umgestaltung und Gleissanierung Sundgauallee in Freiburg Sanierung Sundgaubrücke

Bauablauf

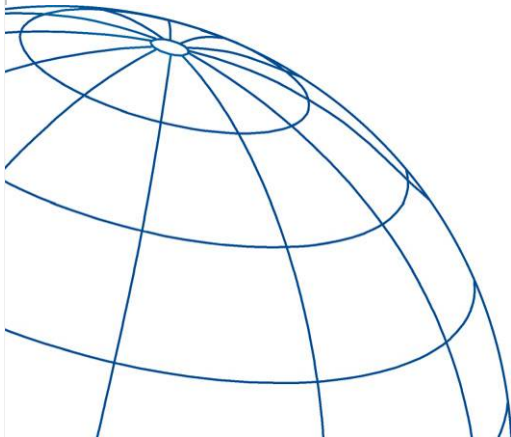

**Öffentliche Informationsveranstaltung
Bürgerhaus im Seepark am 22.03.2016**

Dipl.-Ing. Raimund Gier
Dipl.-Ing. Gero Weindl

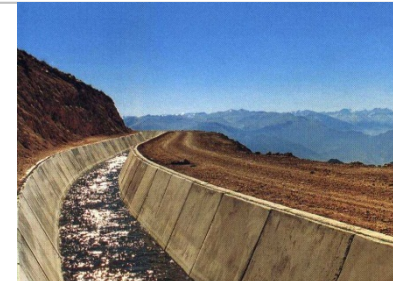


WASSERVERSORGUNG



ABWASSERENTSORGUNG



VERKEHR



BERATUNG

ZAK Sundgauallee - Umfang der Baumaßnahmen 2016



Bauablauf


- **Insgesamt 8 Haupt- Bauphasen**
 - Separate Baumfällarbeiten im Februar 2016 bereits ausgeführt
 - Im Februar/März/April 2016 Verlegung Stromkabel in Gehwegen beidseits (bnNetze, derzeit in Bau)
 - Ab Anfang April 2016: Sanierung Sundgaubrücke und Umgestaltung Sundgaullee weitgehend zeitgleich
 - April bis September 2016: Umbau Südseite Sundgaullee
 - Schwerpunkt der Arbeiten ab 25.07. bis 11.09.2015 während der Schulferien (7 Wochen Sperrpause Stadtbahn mit Schienenersatzverkehr) zur Gleissanierung insgesamt 2 Bauphasen (Bauphase IV und V)
 - Nach den Schulferien Restarbeiten Südseite, danach September / Oktober / November 2016: Umbau Nordseite Sundgaullee (Bauphase VI, VII und VIII)

Bauablauf

- Phase III mit insgesamt 6 Bauphasen vor Sommerferien 2016

Östlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. April'16) :

- Rückbau Bordsteine, Unterbau erneuern, Fahrbahnrand neu
- Fußgängerführung dahinter
- Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
- Stadtbahn ohne Einschränkungen

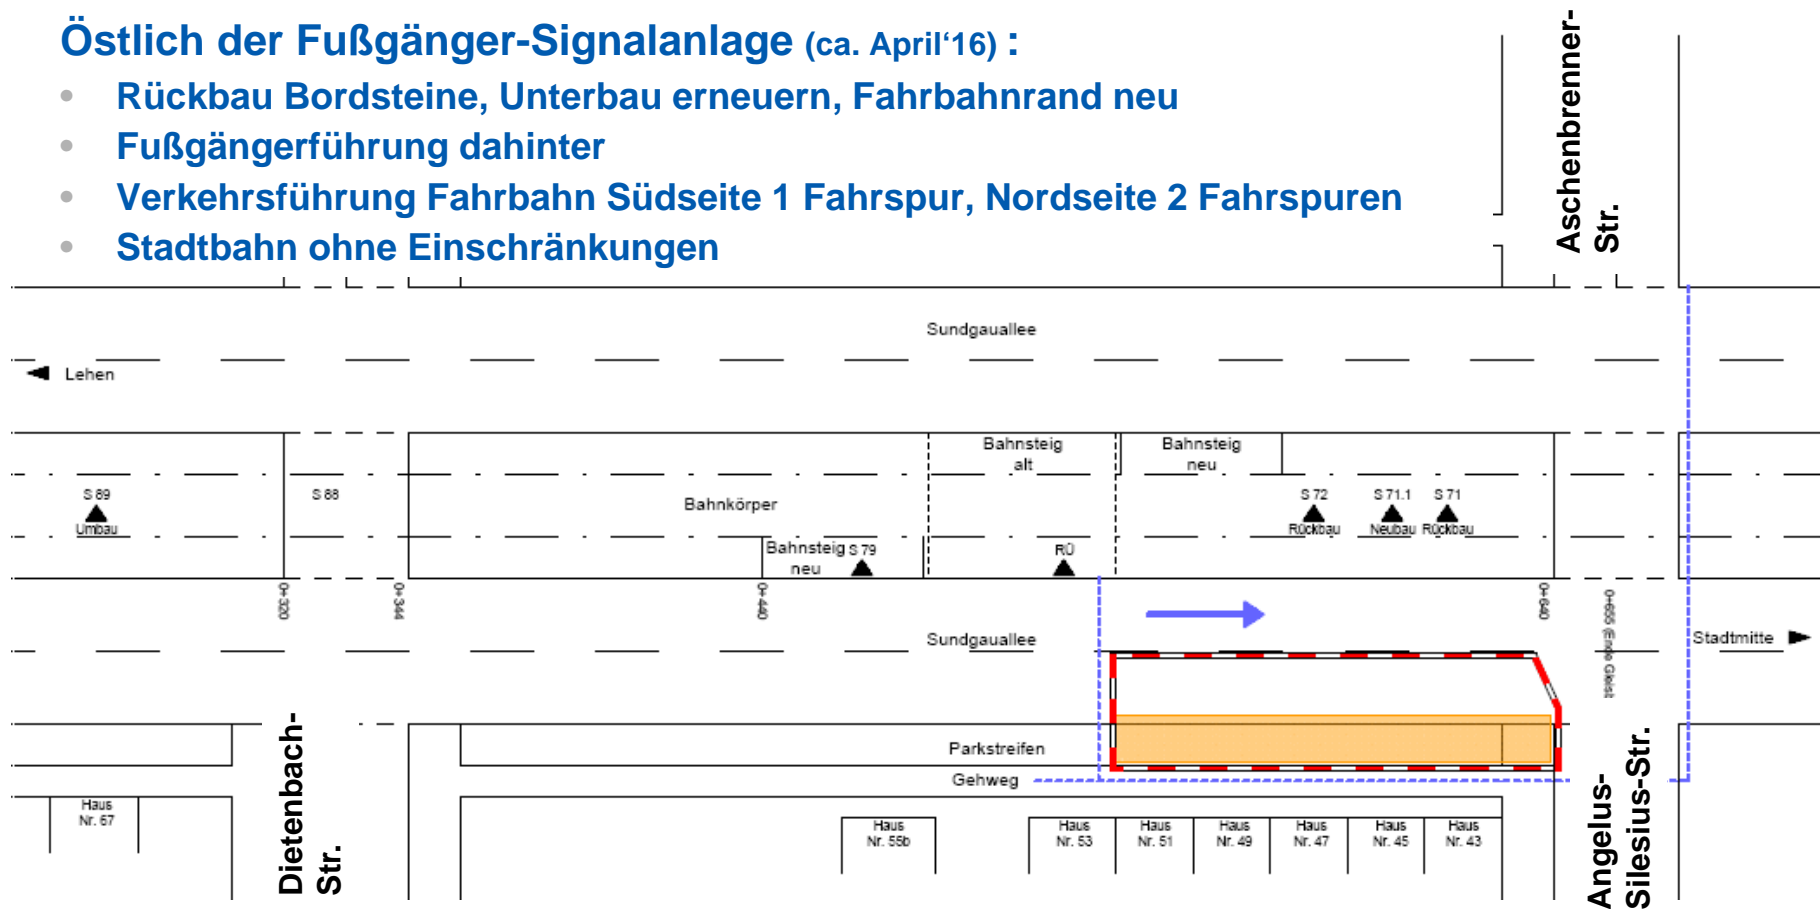


- Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um Parkplätze im westlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können

Bauablauf

- Phase III mit insgesamt 6 Bauphasen vor Sommerferien 2016

Östlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Mai/Juni'16) :

- Neubau Parkstreifen, Gehweg, Baumquartiere und Beleuchtung
- Erneuerung Pflaster Privatflächen
- Fußgängerführung gesichert zwischen Fahrbahn und Baustelle
- Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
- Stadtbahn ohne Einschränkungen

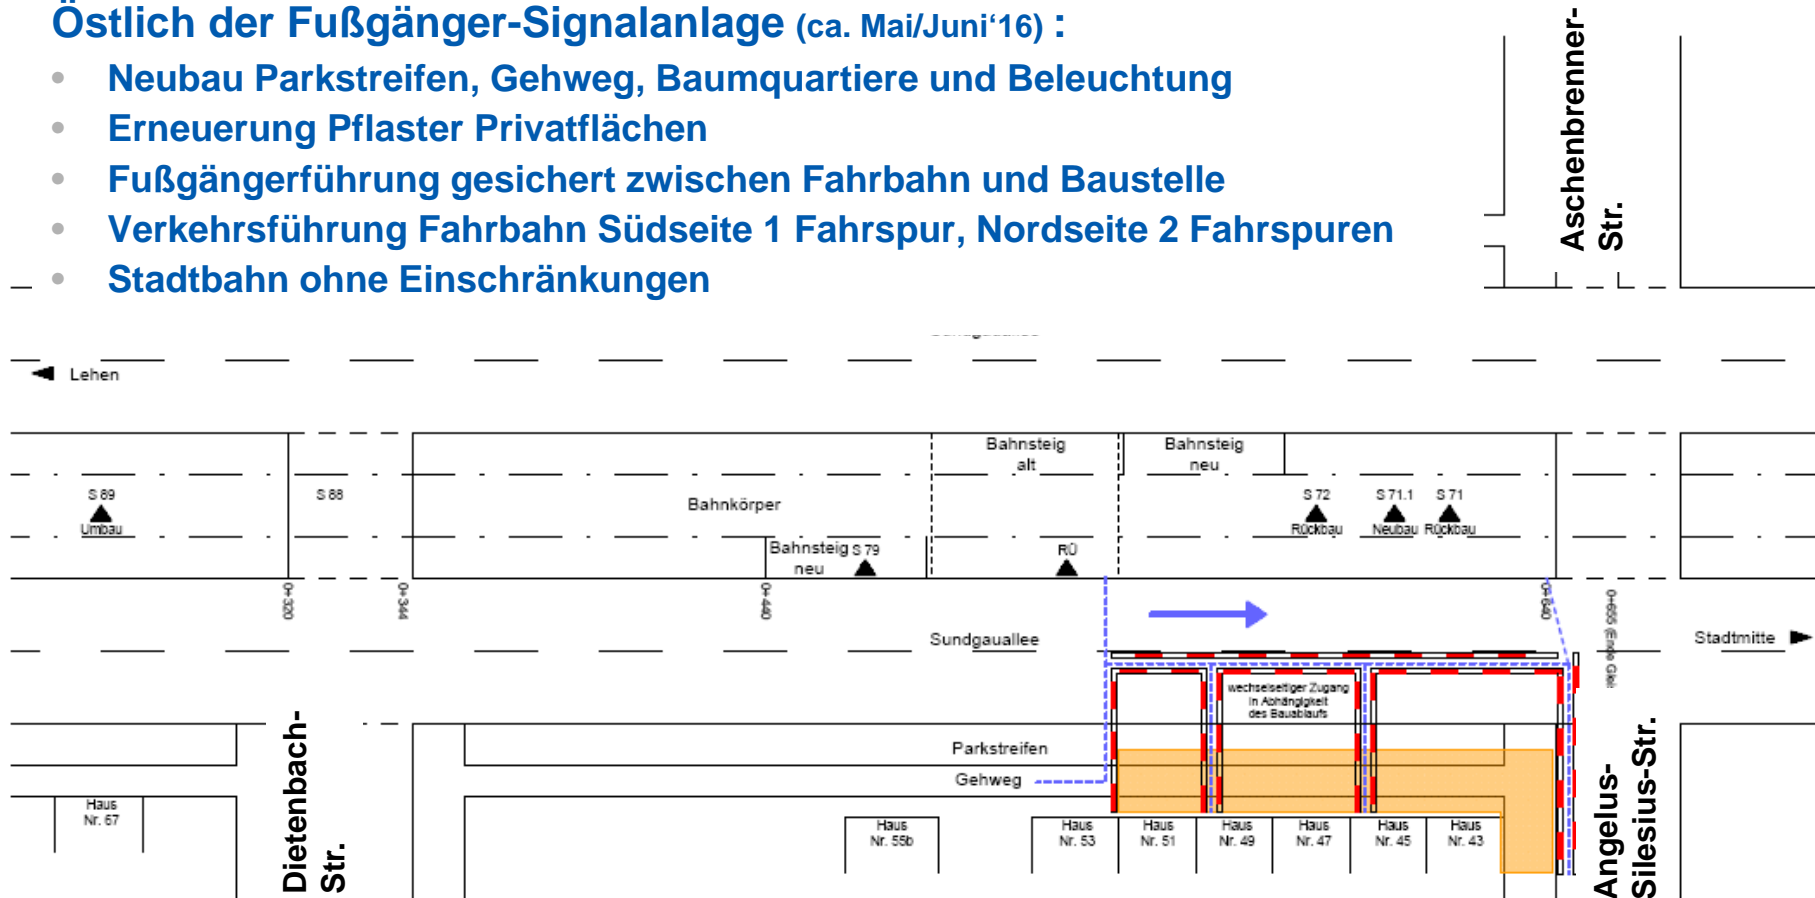


- Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um Parkplätze im westlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können

Bauablauf

- Phase III mit insgesamt 6 Bauphasen vor Sommerferien 2016

Westlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Juni/Juli'16) :

- Rückbau Bordsteine, Unterbau erneuern, Fahrbahnrand neu
- Fußgängerführung dahinter
- Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
- Stadtbahn ohne Einschränkungen

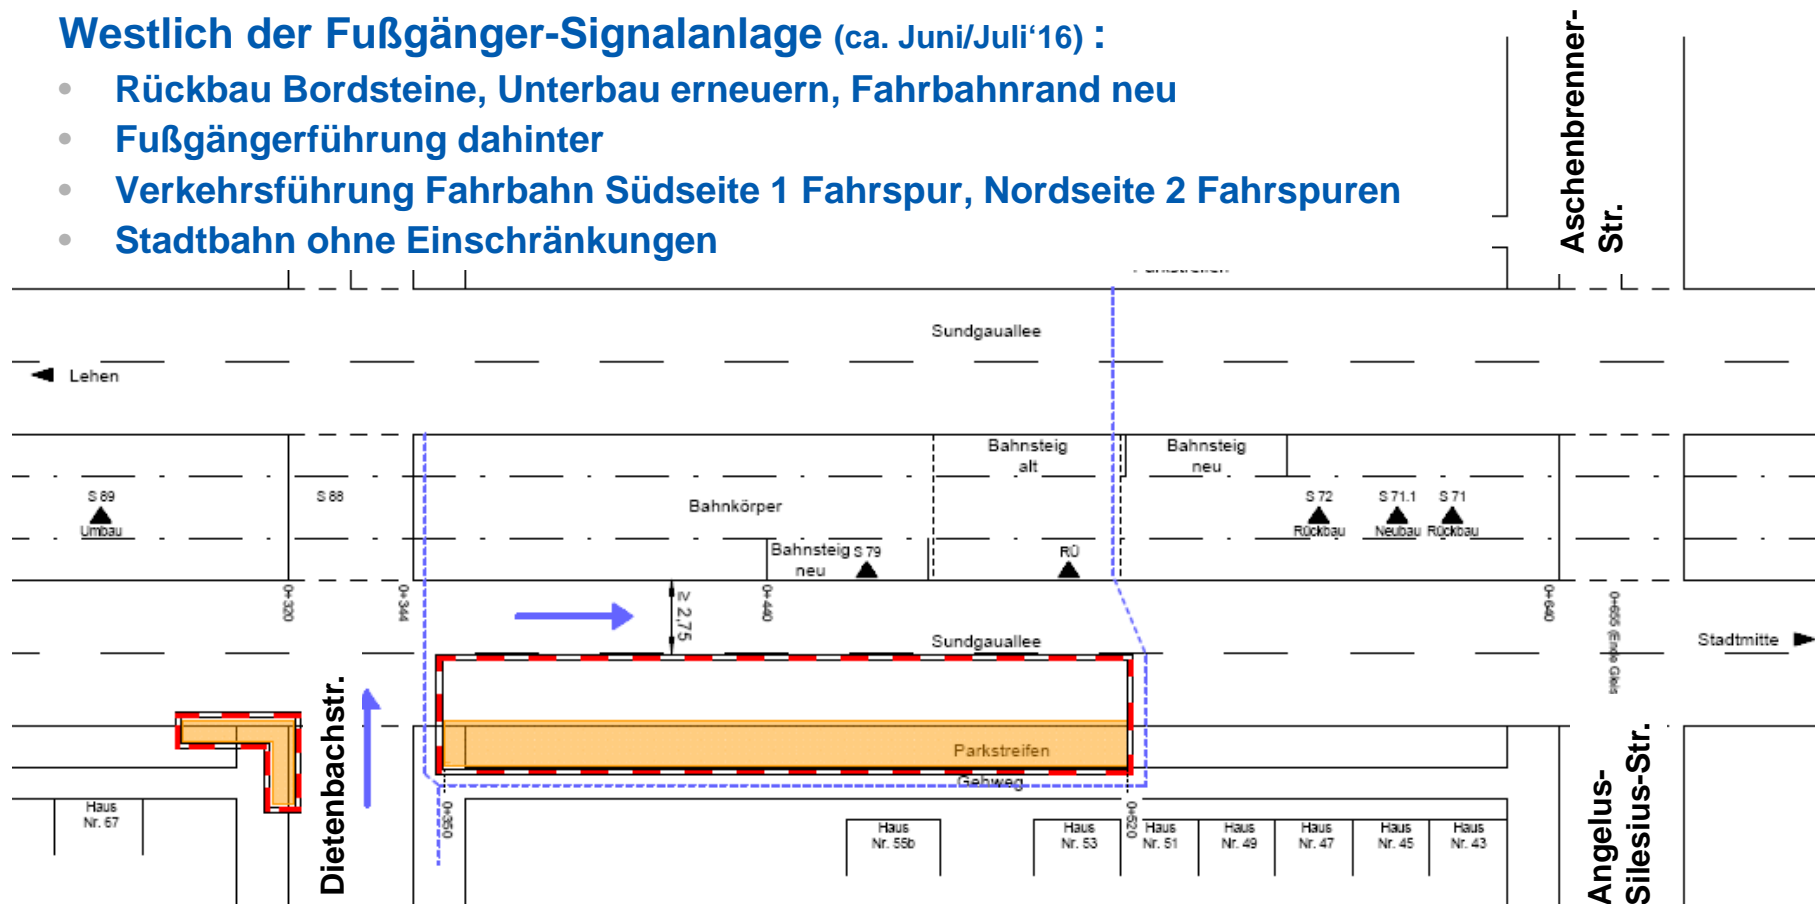


- Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um neue Parkplätze im östlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können

Bauablauf

- Phase III mit insgesamt 6 Bauphasen vor Sommerferien 2016

Westlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Juli/August'16) :


- Neubau Parkstreifen, Gehweg, Baumquartiere und Beleuchtung
- Erneuerung Pflaster Privatflächen
- Fußgängerführung gesichert zwischen Fahrbahn und Baustelle
- Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
- Stadtbahn ohne Einschränkungen

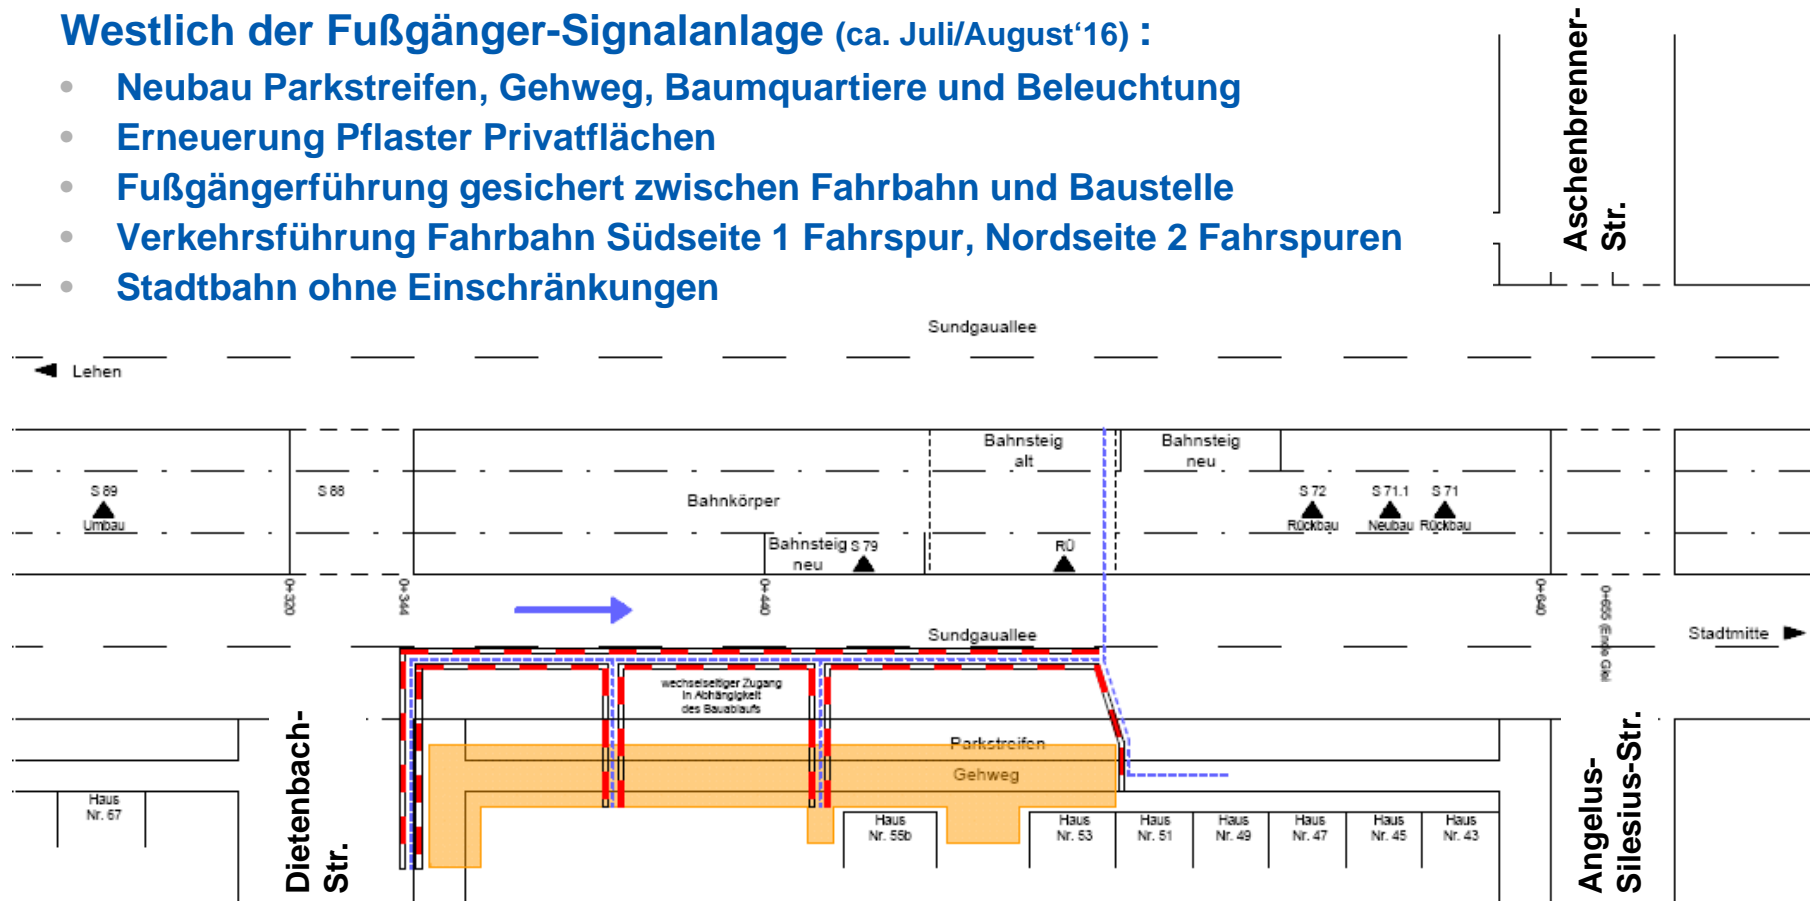

- Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um neue Parkplätze im östlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können

Bauablauf


- Phase IV und V in Sommerferien 2016 (Sperrpause Strab)

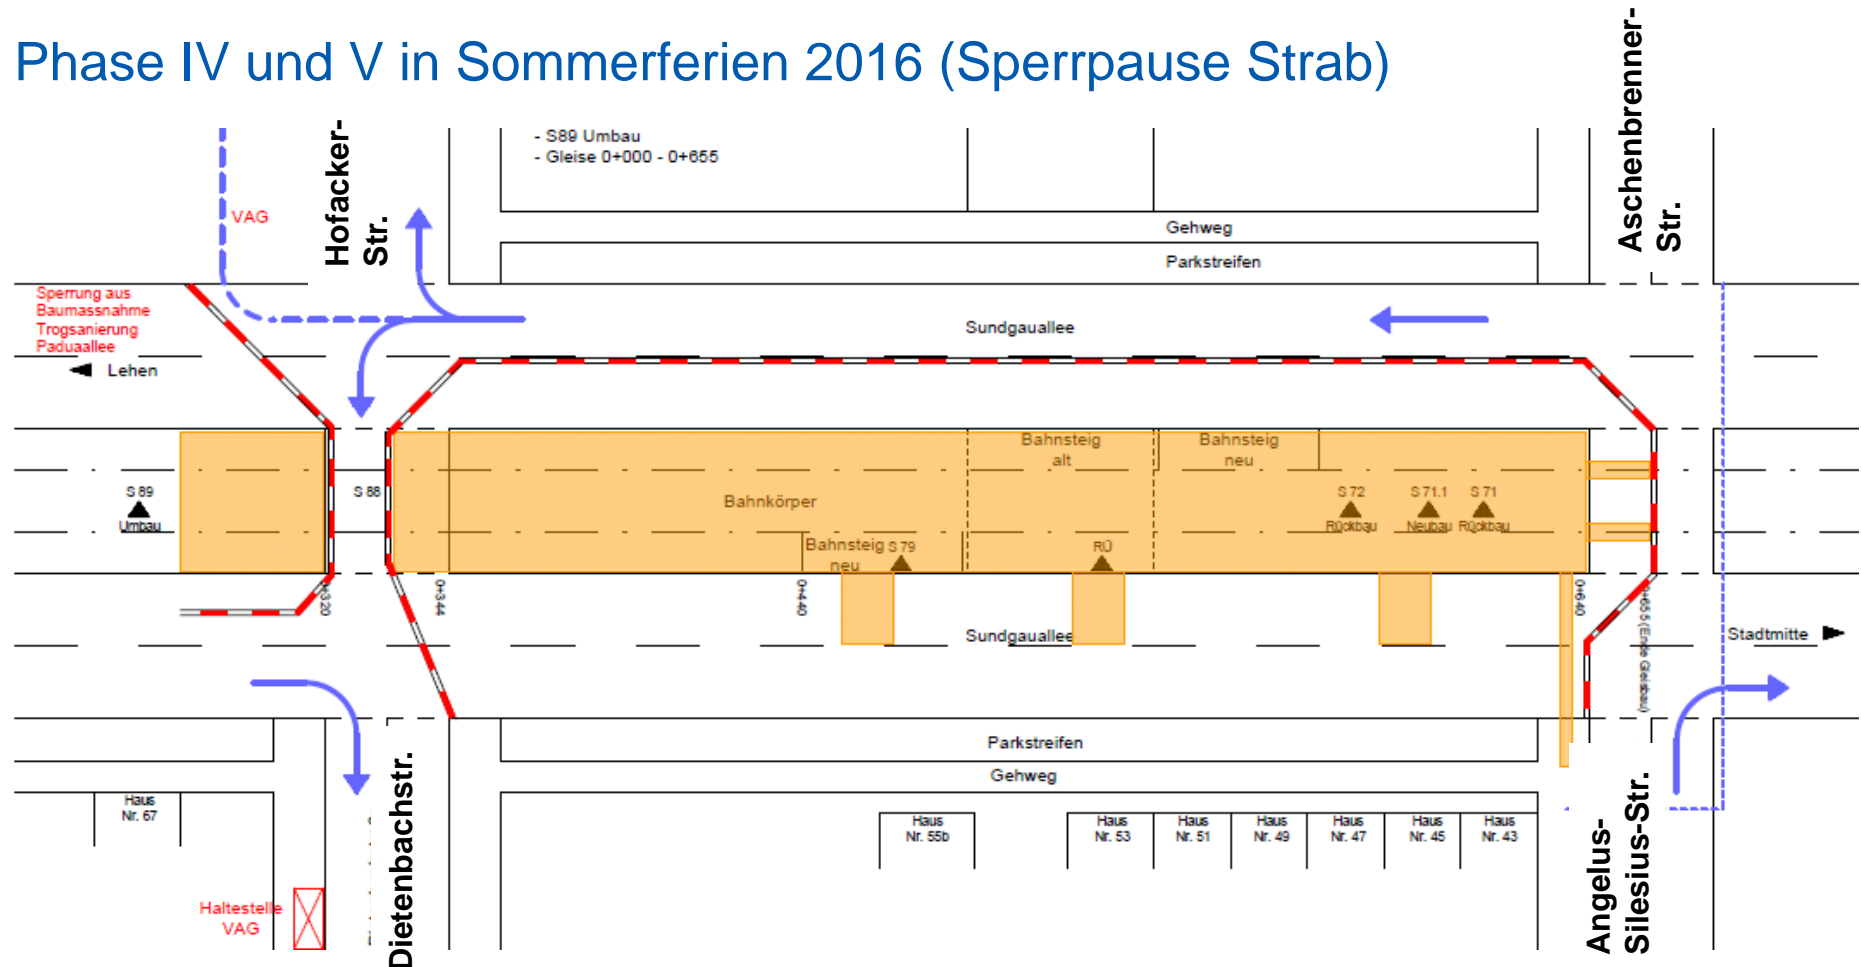

- Rückbau Schienen, Bahnsteige, Schächte
- Neubau Schachtbauwerke, Schutzrohre, Gleisentswässerung, Gleise, Bahnsteige, Randeinfassungen, Pflaster etc.


Bauablauf

- Phase IV (Leitungen, Entwässerung, Schutzrohre etc.)

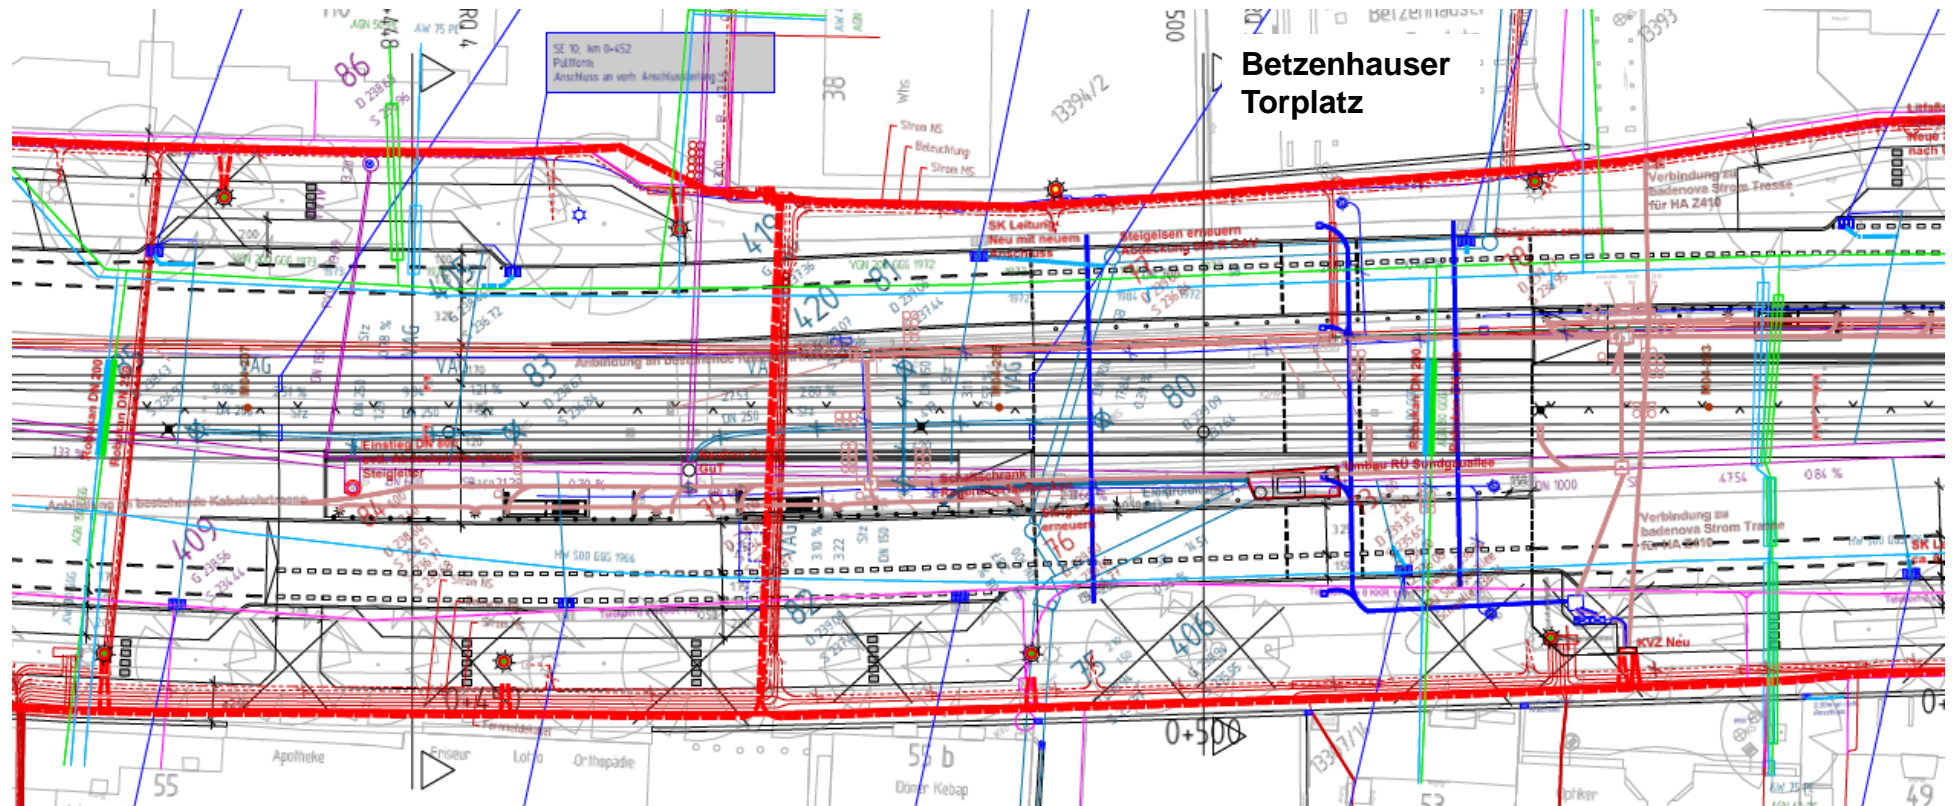

Verkehrsführung

- Großräumiger Umleitungsverkehr über Berliner Allee, B31/Zubringer,

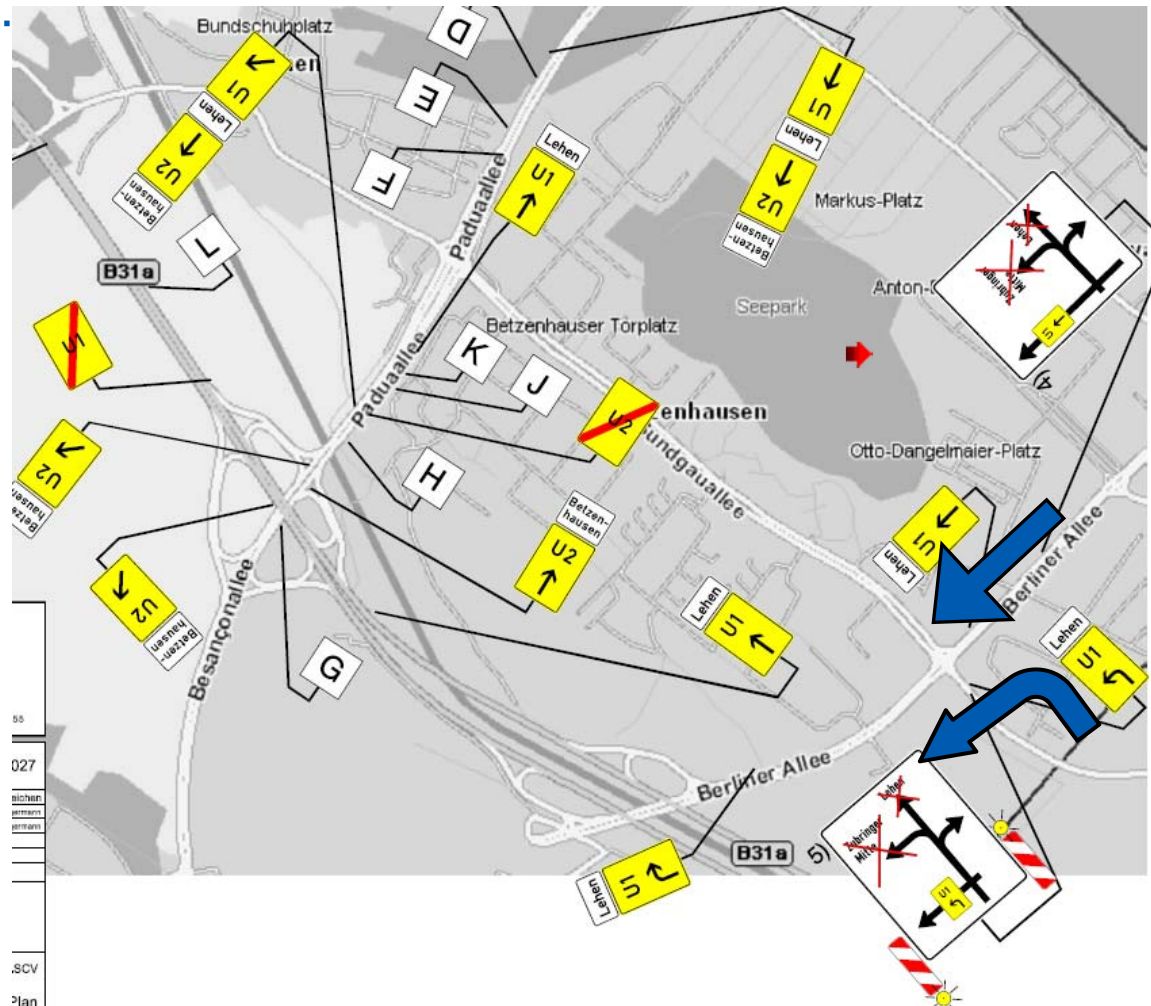


Verkehrsführung

- Erreichbarkeit für Ziel- und Quellverkehr Bereich Sundgauallee und Betzenhausen (Anlieger/Anwohner) immer gewährleistet



- Verkehrsführung bei Sperrung einer Fahrbahn der Sundgauallee über Dietenbachstraße/ Tränkestraße/ Angelus-Silesius-Straße
- ÖPNV wird in Schulferien / Sperrpause Strab mittels Schienenersatzverkehr gewährleistet

Bauzeit

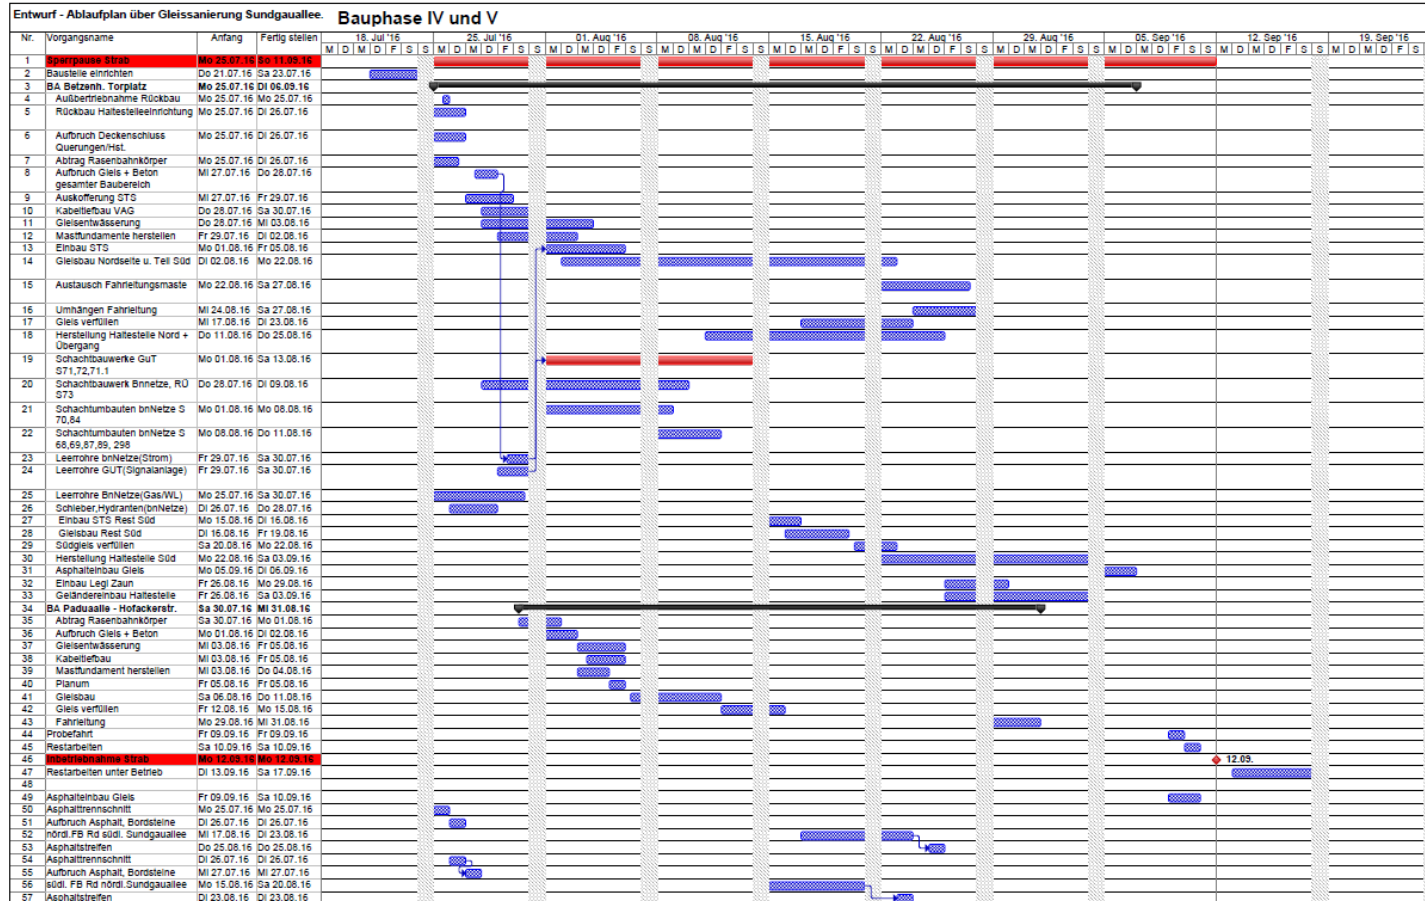


- Bauphase I
Jan./Febr.'16
- Bauphase II: Februar
bis April'16 (bnNetze)
- Bauphase III: April –
September 2016
- Bauphase IV und V:
Sommerferien 2016
- Bauphase VI: nach
Sommerferien bis Anf.
Okt.'16
- Bauphase VII und VIII:
nach Sommerferien bis
Ende November 2016

- **Arbeitszeit:**
**Werktags (z.T. auch an Samstagen) und während der Sommerferien
auch mit verlängerten Arbeitszeiten**

Umgestaltung und Gleissanierung Sundgauallee in Freiburg Sanierung Sundgaubrücke

Bauablauf


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

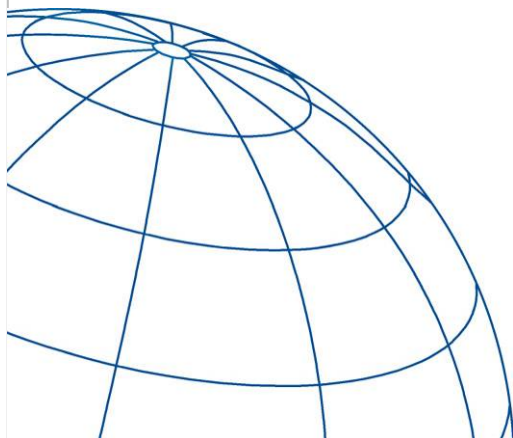

FICHTNER Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5
79110 Freiburg

Telefon
E-Mail

www.fwt.fichtner.de
+49 (0)761 88505-0
info@fwt.fichtner.de

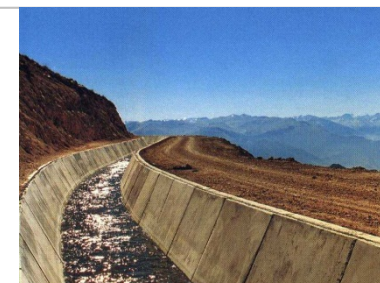


WASSERVERSORGUNG



ABWASSERENTSORGUNG



VERKEHR



BERATUNG
